


農業集落排水統合事業の進捗状況について

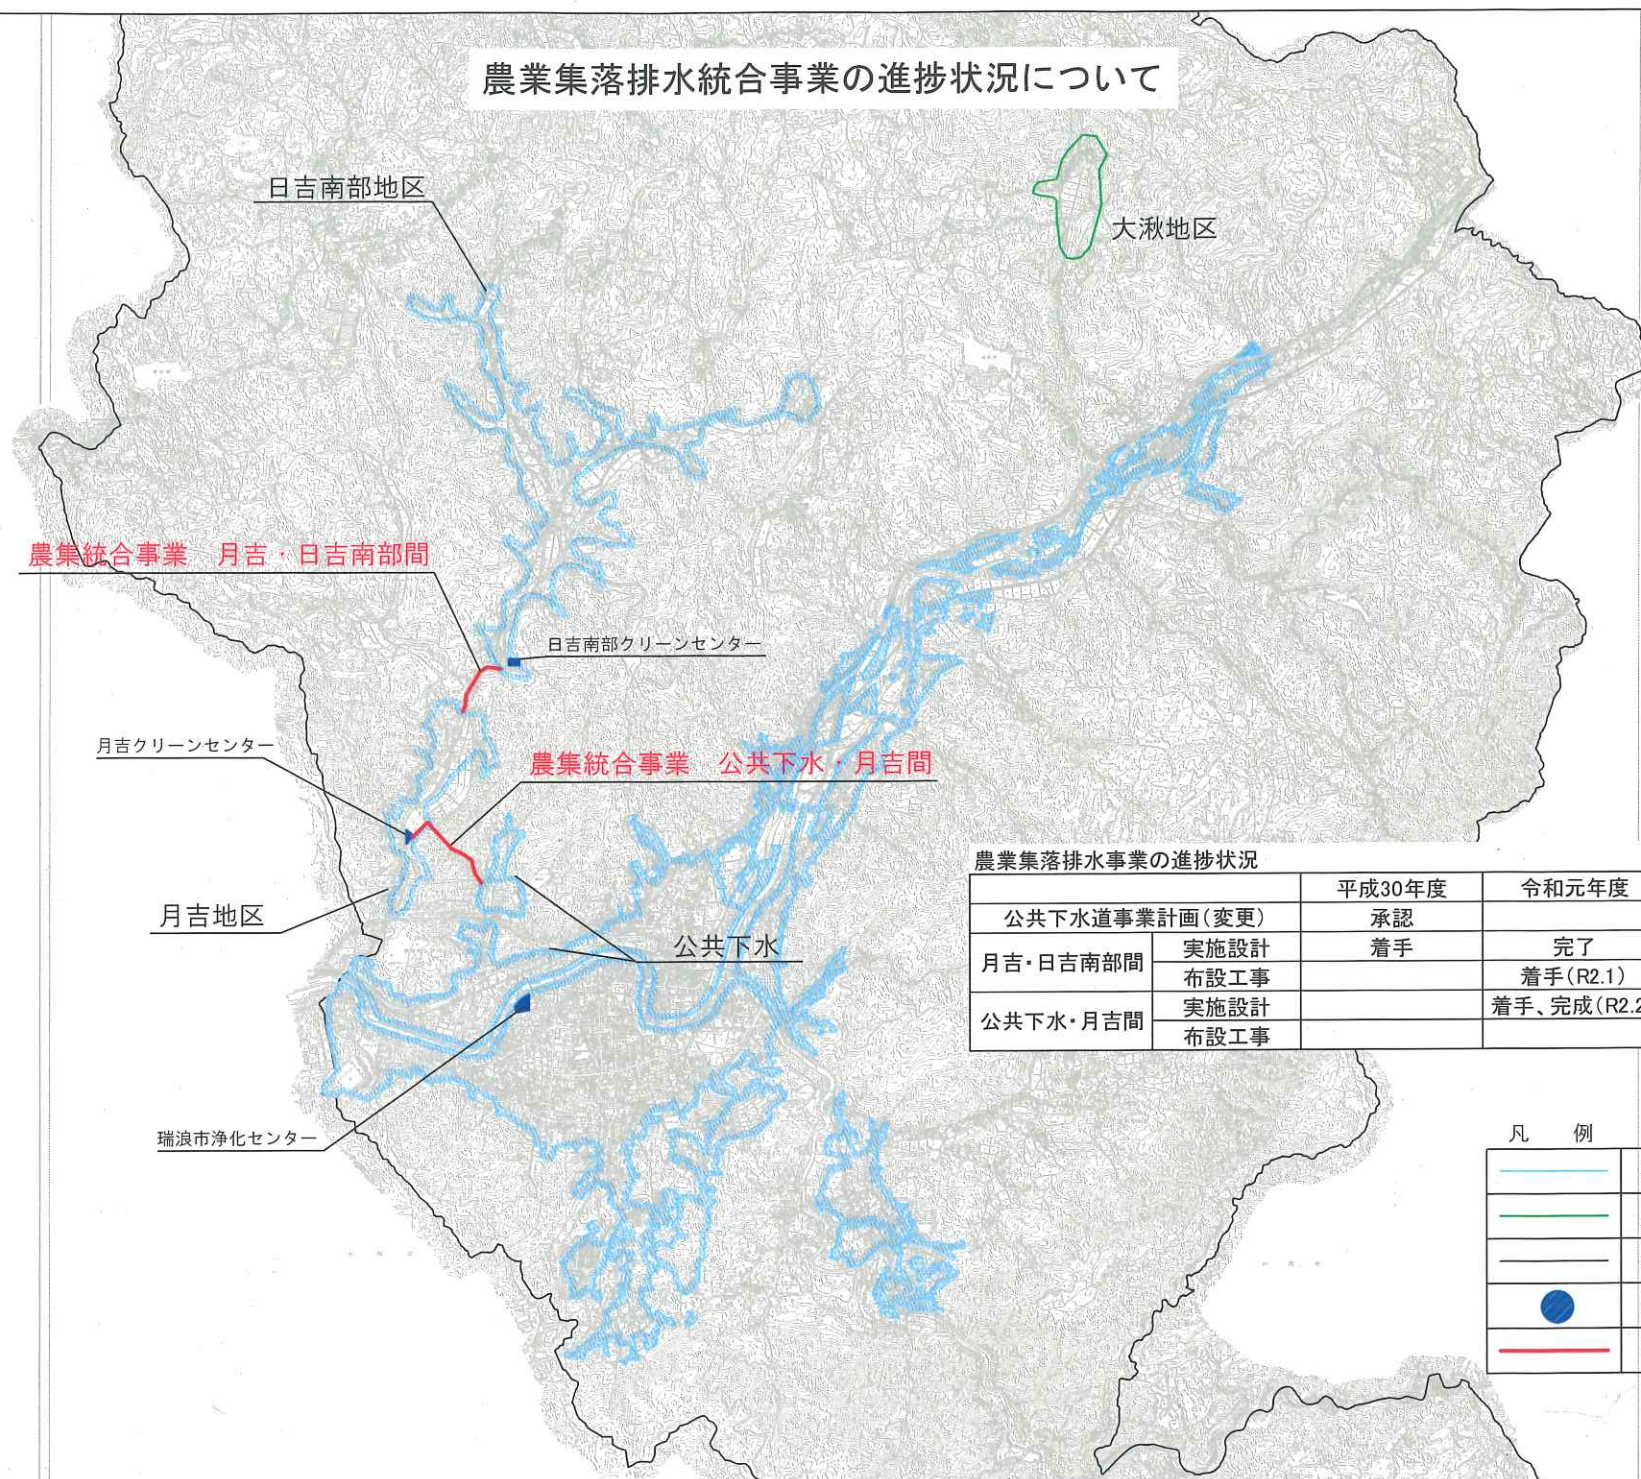

農集統合事業 月吉・日吉南部間

日吉南部クリーンセンター

月吉クリーンセンター

農集統合事業 公共下水・月吉間

月吉地区

公共下水

瑞浪市浄化センター

農業集落排水事業の進捗状況

		平成30年度	令和元年度	令和2年度(予定)
公共下水道事業計画(変更)		承認		
月吉・日吉南部間	実施設計	着手	完了	
	布設工事		着手(R2.1)	完成
公共下水・月吉間	実施設計		着手、完成(R2.2)	
	布設工事			着手、完成

凡 例

	事業計画区域
	農業集落排水区域
	行政界
	処理場
	新設
