

都市再生整備計画 事後評価シート

瑞浪地区

令和6年12月

岐阜県瑞浪市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	岐阜県		市町村名	瑞浪市		地区名	瑞浪地区		面積		234.8ha		
交付期間	平成30年度～令和5年度		事後評価実施時期	令和6年度		交付対象事業費	137.3(百万円)		国費率	0.420			
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	事業名 道路(土岐橋架替関連道路、市道下益見1号線、市道文化センター前線)、公園(中央公園、狭間川公園)										
		提案事業	・事業活用調査(事業効果分析)										
		事業名					削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
	当初計画から削除した事業	基幹事業	・道路(市道下益見1号線、市道文化センター前線)			市道下益見1号線:地権者との交渉が難航し、整備の見込みが立たなかったため。 市道文化センター前線:地権者との交渉が難航し、2期計画で実施するため。			基幹事業である道路の一部事業削除に伴い、目標値「160人」から「158人」に減少させた。				
		提案事業	・事業活用調査(事業効果分析)			市単独事業として実施するため。			影響なし				
	新たに追加した事業	基幹事業											
		提案事業											
	交付期間の変更	当初	平成30年度～令和4年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響	影響なし							
		変更	令和30年度～令和5年度										
	2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指 標		単位	従前値		目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)
				基準年度		目標年度	モニタリング	評価値					
指標1		改良道路の歩行者数	人/日	156	H29年度	158	R5年度		161	○	あり なし	道路改修により、住民生活の便利さと安全性の向上が図られた。	—
指標2		施設の利用者数	人/年	12,336	H29年度	12,706	R5年度		9,630	△	あり なし	新型コロナウイルスの影響により野外学習地利用者は減少したが、東屋、トイレ、遊具等の設置等が利用者の利便性の向上や地域の憩いの場としての利用増につながっている。	令和7年3月
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指 標		単位	従前値		目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期
				基準年度		目標年度	モニタリング	評価値					
	その他の数値指標1												
	その他の数値指標2												
4)定性的な効果発現状況	その他の数値指標3												
5)実施過程の評価	実施内容					実施状況					今後の対応方針等		
	モニタリング		—			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった					—		
	官民連携による取組		—			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった					—		
	持続的なまちづくり体制の構築					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							


様式2-2 地区の概要

瑞浪地区(岐阜県瑞浪市) 都市再生整備計画事業の成果概要								
まちづくりの目標	目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
大目標:安心・快適に暮らせる魅力あるまちづくり 目標1:交通ネットワークの充実による利便性の高いまちづくり 目標2:快適な生活環境の創出	改良道路の歩行者数	単位: 人/日	156	H29年度	158	R5年度	161	R5年度
	施設の利用者数	単位: 人/年	12,336	H29年度	12,706	R5年度	9,630	R5年度
	公園の利用回数	単位: 予約数/年	541	H29年度	568	R5年度	488	R5年度
		単位:		H		R		R
		単位:		H		R		R

■狭間川公園



■中央公園

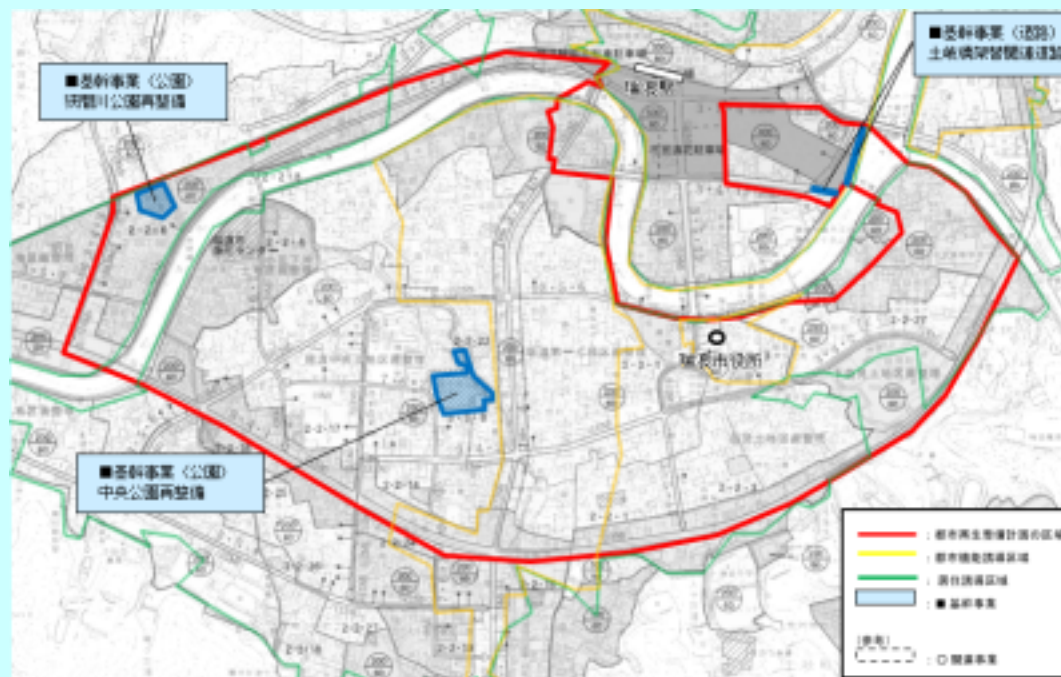

■土岐橋架替関連道路

- ・住吉線



- ・文化センター前線



まちの課題の変化	
今後のまちづくり の方策 (改善策を含む)	
