

あきよホタルの里 “福”
キャラクター

R7年度　夢づくり地域交付金　ステップアップ事業　実績報告審査会

“あきよホタルの里 ”福“　第3次整備事業





日時：令和8年9月9日（月）18時15分～
場所：瑞浪市役所西分庁舎１階　会議室
報告：明世地区まちづくり推進協議会



あきよホタルの里 “福”
キャラクター

本日の説明項目



あきよホタルの里 “福”
キャラクター

1．ステップアップ事業の概要

2．ステップアップ事業の実績

3．ホタル育成事業の取組み



あきよホタルの里 “福”
キャラクター

1．ステップアップ事業の概要

■-1）事業名

あきよホタルの里 “福” 第3次整備事業…
泥流入防止機能追加及び見学通路安全向上工事等



あきよホタルの里 “福”
キャラクター

■-２）事業の申請理由と成果

①見学通路の安全向上として、ソーラ誘導灯を設置。
②これまでの整備事業で未着手着となっていた南側通路の見学通路の整備。
③沈砂池及びｶﾜﾆﾅ育成大型水槽への泥流入軽減及び沈砂池への落葉防止と転落防止のためのアルミパネルの設置。

３　事業成果（目標に対しての成果：数字等でわかりやすく）		
１）見学通路全体の、安全誘導灯（地面差込式ｿｰﾗ仕様）×30個　＊市販既製品		→　計画通り
２）南側見学通路の安全性向上工事	①防御柵工≒20ﾒｰﾄﾙ（ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ）＊ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	→計画通り
	②ゴムマット≒幅1ﾒｰﾄﾙ×長30ﾒｰﾄﾙ	
３）沈砂池用　泥砂流入削減工事	①沈砂池用マス（地面埋込）×３個＊FRP製	→計画通り
カワニナ飼育用大型水槽への泥砂流入削減工事		
	①沈砂池用マス（地面埋込）×１個＊FRP製	→計画通り
	②沈池砂用アルミパネル設置	→計画通り



あきよホタルの里 “福”
キャラクター

2. ステップアップ事業の実績

■-3）事業の活動経過と収支



タルの里“福”
ラクター

7　活動経過、活動の内容

（単位：円）

実施予定時期	活動の内容	経費の内容	
		決算科目	金額
4月			
5月	①見学通路安全誘導灯設置（ﾊﾛｰHC）		
6月	秋観賞会…15日～30日 （彩りマーケット、釜戸地区ホタルまつり）	消耗品	47,421
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月	沈砂池及びｶﾜﾆﾅ育成用水槽への泥砂 流入削減工事　（Iアイ設備）		
1月		請負工事費	2,000,000
2月	②南側見学通路安全柵工事 （板垣造園）		
3月		請負工事費	1,000,000
合計			3,047,421

1 ページ

8　収支実績

（1）収入の部

（単位：円）

内　　容	本年度予算額	本年度実績額
夢づくり地域交付金	3,000,000	3,000,000
自主財源	77,034	47,421
その他（　　）	0	0
合　　計	3,077,034	3,047,421

（2）支出の部

（単位：円）

事　　項		支出内容	本年度予算額	本年度実績額
経費区分	活動の内容			
消耗品	安全誘導灯購入及び設置	購入品	43,110	47,421
材料費	南側見学通路安全柵工事	請負工事費	1,012,000	1,000,000
材料費	用水路泥砂流入防止工事	請負工事費	2,021,924	2,000,000
合　　計			3,077,034	3,047,421



あきよホタルの里“福”
キャラクター

2. ステップアップ事業の実績

■-１)誘導灯の設置



あきよホタルの里 “福”
キャラクター

誘導灯の設置(30ケ)





あきよホタルの里 “福”
キャラクター

“フリューム”両壁面に貼り付けるヤシマット

2. ステップアップ事業の実績

■-２)南側見学通路の整備

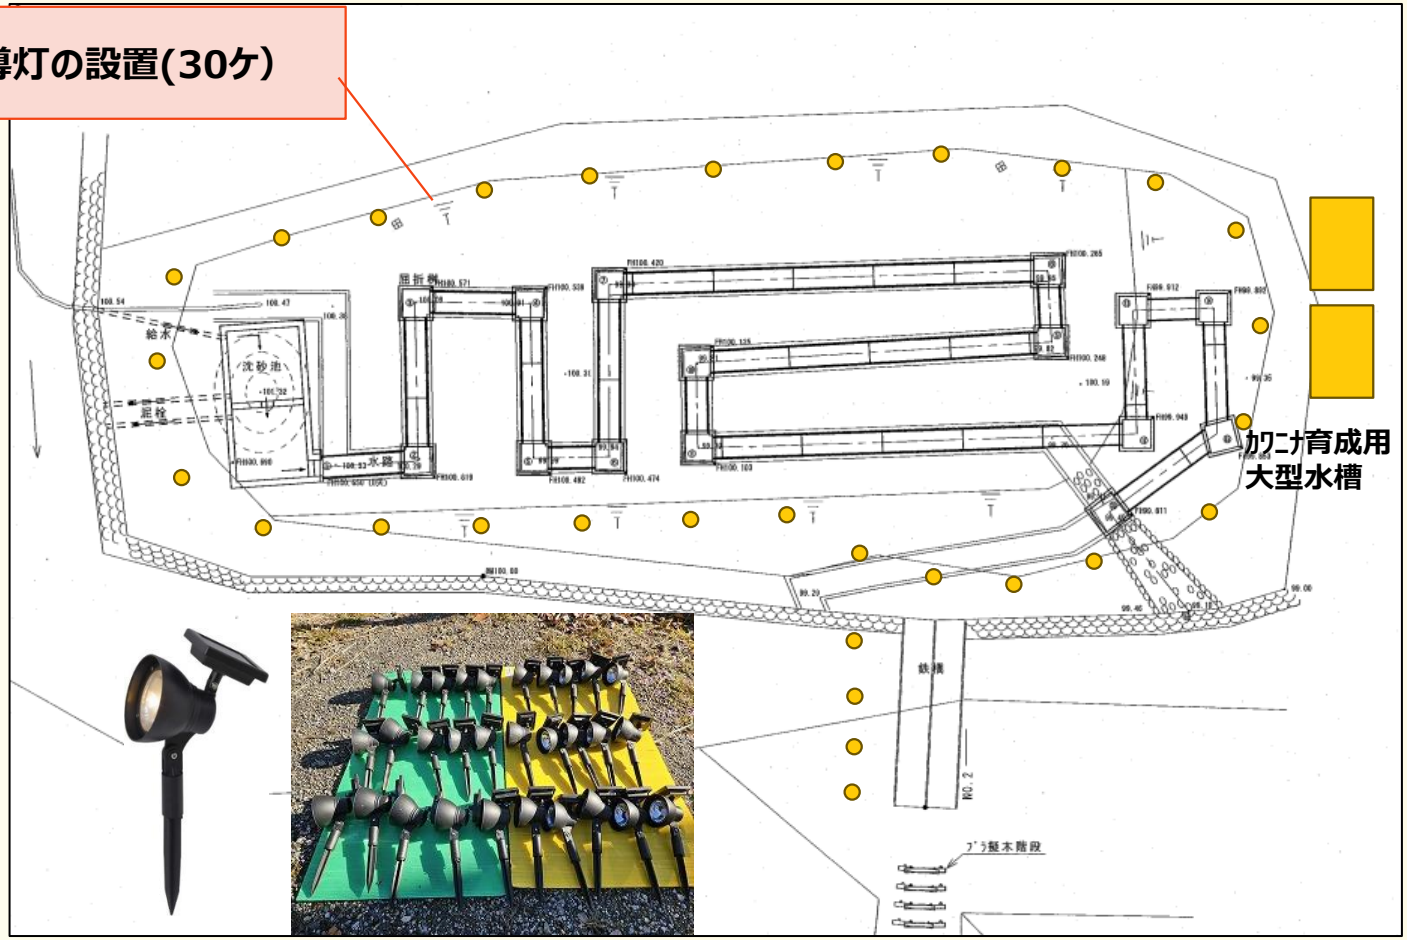

あきよホタルの里 “福”
キャラクター

防護柵及びゴムマット





あきよホタルの里 “福”
キャラクター

“フリューム”両壁面に貼り付けるヤシマット

2. ステップアップ事業の実績

■－３）沈砂池用　泥砂軽減工事(2ヶ所)

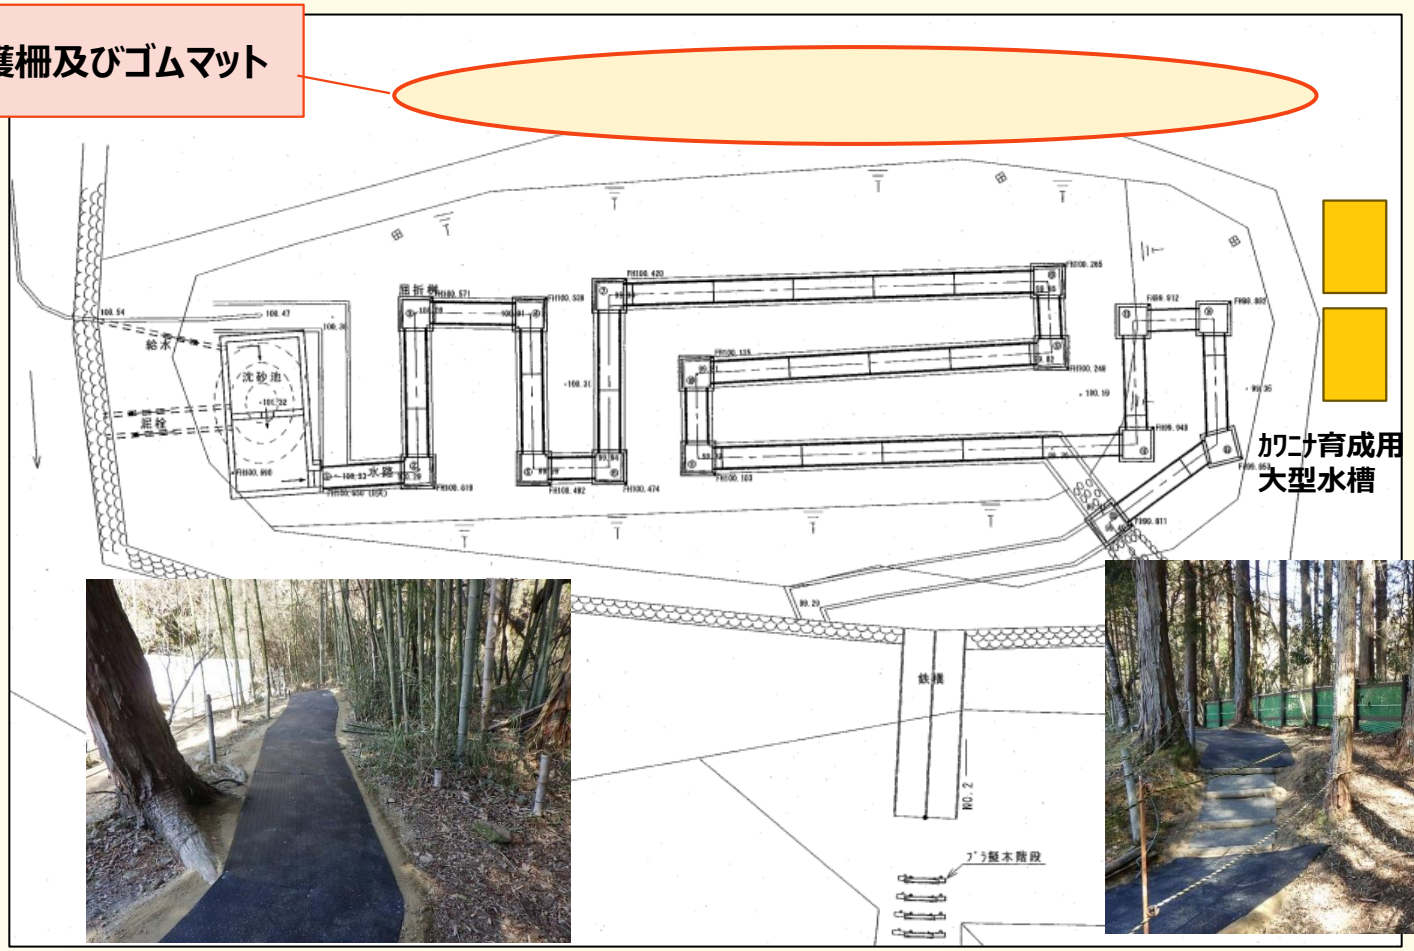

あきよホタルの里 “福”
キャラクター

**埋込式　泥砂
軽減装置**

**埋込式　泥砂
軽減装置**





**カワニナ育成用
大型水槽**





あきよホタルの里 “福”
キャラクター

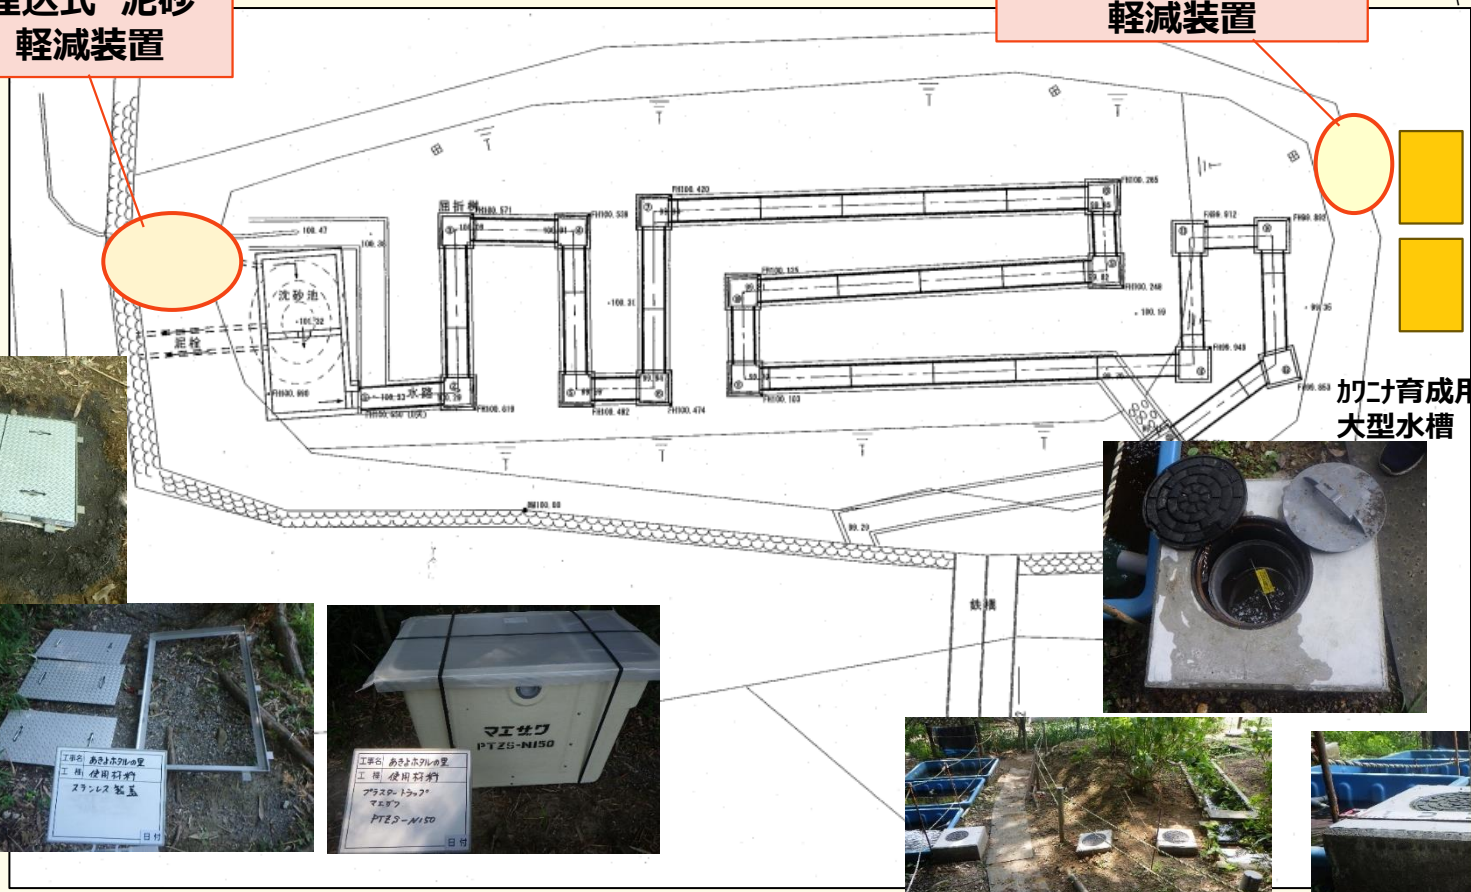2．ステップアップ事業の実績

■－４)沈砂池の整備(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ)



あきよホタルの里 “福”
キャラクター





あきよホタルの里 “福”
キャラクター

“フリューム”両壁面に貼り付けるヤシマット

3. ホタル育成事業の取組み

■-1）ホタルの一生 (約9ケ月…)

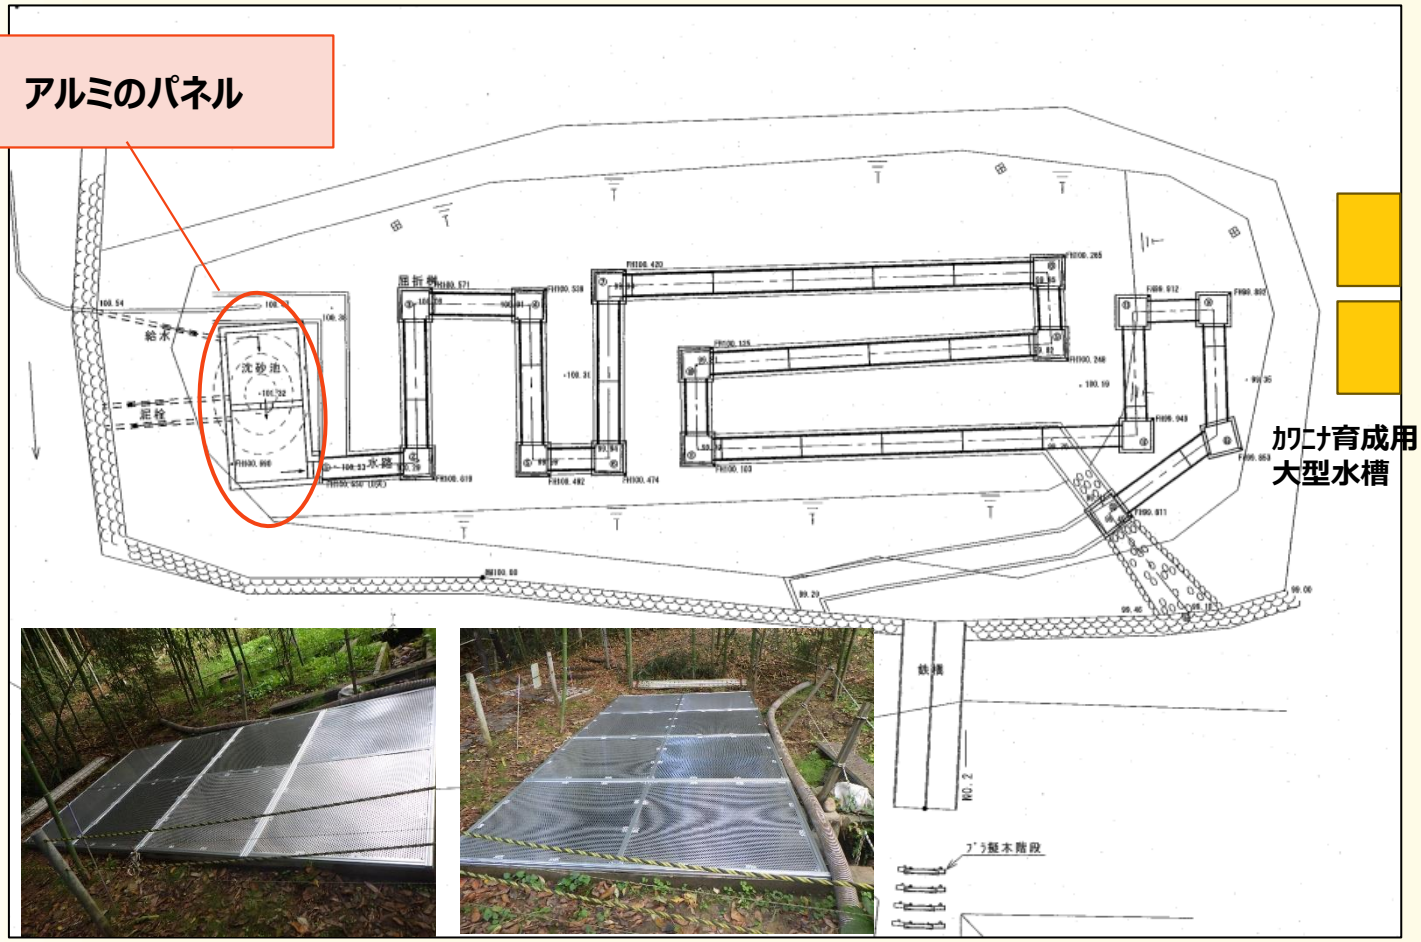

あきよホタルの里 “福”
キャラクター

1月～3月
- ・草刈り
- ・幼虫の放流
- ・沈砂池の泥だし
- ・カワニナ



4月～6月
- ・ホタルの勉強会
- ・ホタルナイト＆観賞会
- ・産卵用♂♀捕獲
- ・保育器による産卵
- ・草刈り
- ・カワニナ

10月～12月
- ・草刈り
- ・用水路の泥だし
- ・カワニナ

7月～9月
- ・里親水槽設置
- ・草刈り
- ・水路の清掃
- ・孵化
- ・カワニナ



あきよホタルの里 “福”
キャラクター

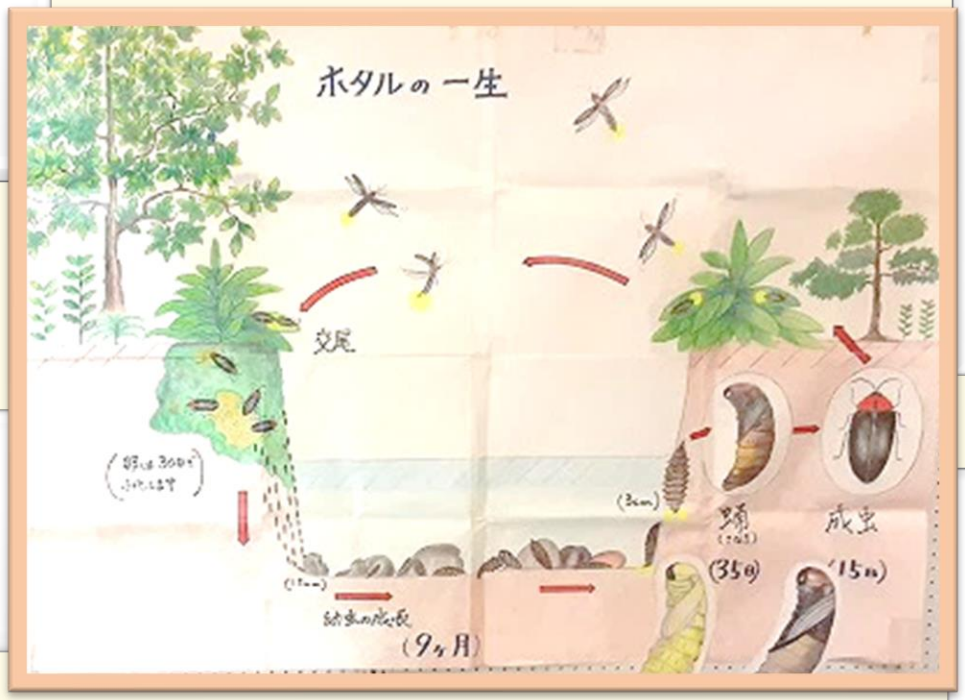3. ホタル育成事業の取組み

■-1）あきよ＝ホタルの里

✓狭間川エリアの他、月吉日吉川エリアにも拡大



ｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ西狭間川



あきよホタルの里 “福”
キャラクター



あきよホタルの里“福”





中電東側の水田附近



市民公園（ホタルのせせらぎ広場）



インタ入り口～明世小学校
狭間川一帯



あきよホタルの里 “福”
キャラクター

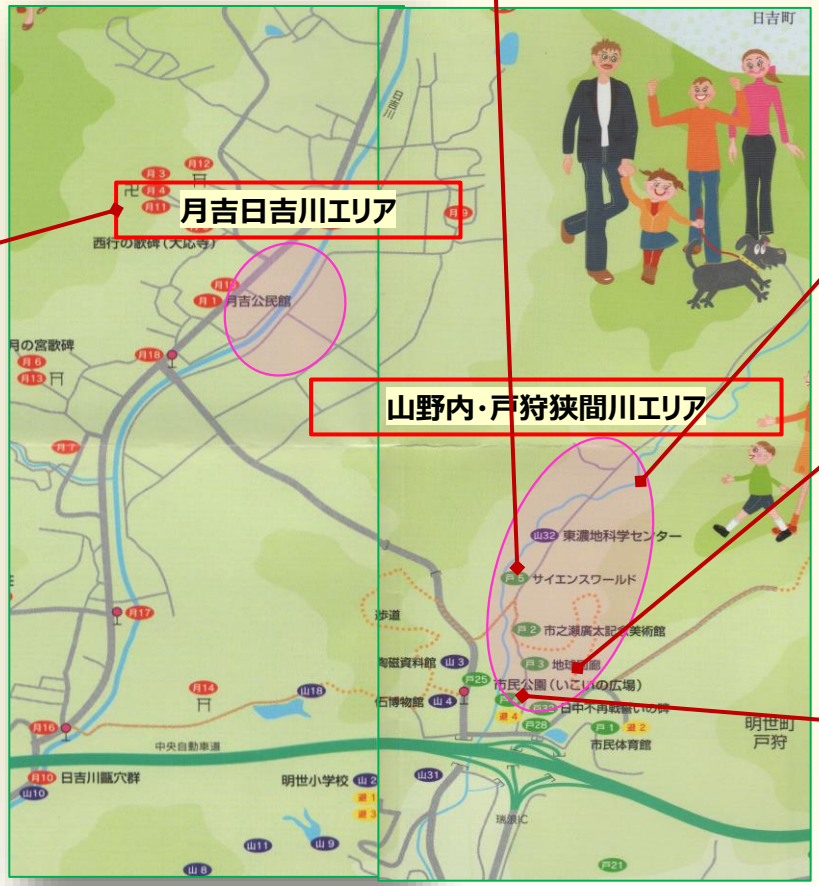3. ホタル育成事業の取組み





あきよホタルの里 “福”
キャラクター

サイエンスワールド西狭間川観賞会場



土岐町　マツイデンキ
　後藤正樹氏撮影提供
モデル／松井洋子さん



あきよホタルの里 “福”
キャラクター

3. ホタル育成事業の取組み



ホタルの里“福” 観賞会場

土岐町　マツイデンキ
後藤正樹氏撮影提供
モデル／松井洋子さん、他



あきよホタルの里 “福”
キャラクター



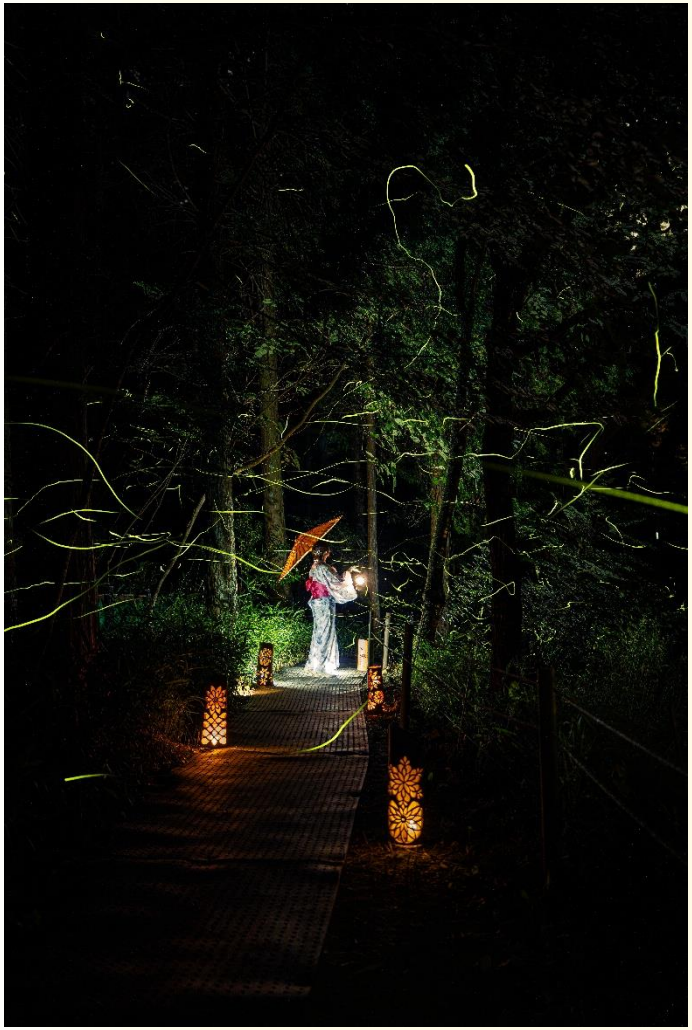

あきよホタルの里 “福”
キャラクター

3. ホタル育成事業の取組み

■-3）ようこそ○○○の町　瑞浪へ･･･5つ目の登録を目指して！



あきよホタルの里 “福”
キャラクター







あきよホタルの里 “福”
キャラクター



R7年度
夢づくり地域交付金
ステップアップ事業

明世地区まちづくり推進協議会

令和8年度コミュニティ・スクール合言葉

あかるいあいさつ
きらきらえがお
よさを知る





あきよホタルの里 “福”
キャラクター

あきよの子が住む街

明世小学校区（月吉・戸狩・松ヶ瀬・山野内・薬師・和合）



あきよホタルの里 “福”
キャラクター

ご清聴ありがとうございました。
